


Bis zum 23.12.11



Der Lüftungsbauer hat die Hauben und fehlende Teile montiert.  
Jetzt fehlen noch Abschlußbleche zwischen Haube und Decke, Abluftrohr von der kleinen Haube und die Inbetriebnahme.

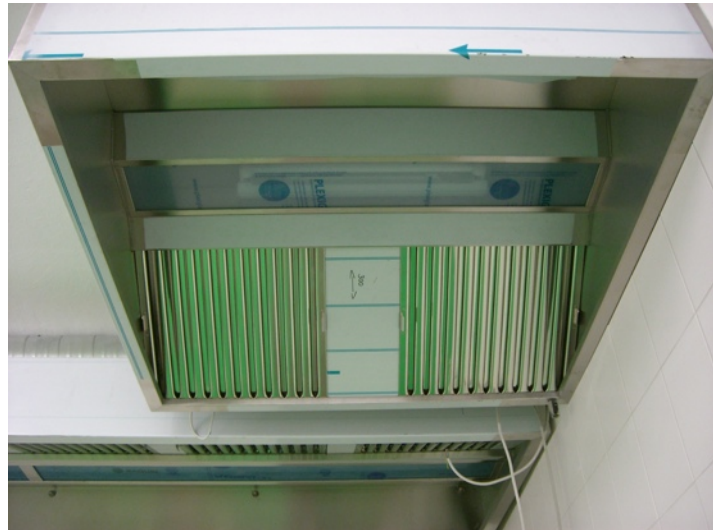

Der Fliesenleger ist fertig!!!!!!





Nachdem die grüne Sperrschicht aufgebracht war, konnte der Boden mit Fliesen geklebt und verfugt werden. Danach wurden alle Kanten mit Silikon abgedichtet.



Der Tischler hat den Türanschlag zum Tagesraum geändert und die Schiebetür in der Küche eingebaut.





Der Heizungsbauer hat die Verlegung der Heizungsrohre für Wärmetauscher und Heizkörper des WC´ sowie der neuen Waschküche auf dem Dachboden mit erforderlichen Pumpe und Kreuzventil abgeschlossen.



Die Montage des Wc´s mit Waschbecken ist auch schon fertig.



Die Therme wurde an ihren Platz gekämpft. Und läuft. Diverse Eckventile wurden auch schon gesetzt.

Und nu !!!

Frohe Weihnachten aus Hohenfelde

